

Gestion de Projet

Pr. M'hamed OUTANOUE

mhamed.outanoute@gmail.com

Année universitaire : 2025/2026

1

Chapitre 4 : MS PROJECT – Partie 1

- 1. Découverte de MS Project**
- 2. Planification**
- 3. Estimation des tâches**

2

1) Découverte de MS Project

1.1) Pourquoi MS Project

1.2) L'interface de MS Project

1.3) Création d'un projet

3

1.1) Pourquoi MS Project : outils puissants

Un véritable logiciel de gestion de projet apportant un certain nombre d'**outils puissants** et très utiles lorsque l'on travaille sur des projets compliqués (longs, traitant beaucoup de tâches, impliquant beaucoup de ressources...) :

- ❑ Un **moteur de planification** projet, permettant de réaliser de la *planification dynamique* :

Au lieu de préciser des dates « en dur » pour les tâches du projet, vous pourrez travailler sur des dates relatives sur un ensemble de tâches reliées entre-elles par des contraintes structurelles, et aurez ainsi la possibilité de simuler le changement de date de départ de votre projet en un clic, ou encore d'obtenir d'identifier le chemin critique du projet sans aucun effort.

4

1.1) Pourquoi MS Project : Outils puissants

- ❑ Une démarche anticipative grâce au **pilotage de projet** et aux **simulations** : Project vous permettra de répondre à des question du type :
 - Que se passe-t-il si je dispose d'une ressource supplémentaire ?
 - Combien de budget aurai-je consommé à 1 mois de la fin du projet ?
- ❑ Des **rapports avancés** et automatiques, permettant de raisonner et de communiquer sur le projet de manière très simple et extrêmement efficace.
- ❑ Une intégration aisée avec le reste du SI de l'entreprise (assignation de tâches à des membres d'un annuaire LDAP Active Directory de l'entreprise, intégration de listes de tâches SharePoint...).

5

1.1) Pourquoi MS Project : Une référence

- ❑ MS Project existe depuis **1984** ! Plusieurs décennies de R&D et d'amélioration continue en ont fait un outil réellement adapté aux besoins des entreprises.
- ❑ MS Project est utilisé par plus de **20 millions de personnes** dans le monde. On connaît l'importance des communautés d'utilisateurs de logiciels dans la recherche de solution à des problèmes communs ou plus complexes, via des forums, blogs, réseaux sociaux, conférences, etc. En ce sens, Project est aussi une référence.
- ❑ MS Project a été choisi par de très grosses structures, comme par exemple Toyota, Intel, BMW, 21st Century Fox ou encore Netflix.
Ceci est un bon indicateur de la fiabilité de la solution et de sa capacité à « scaler » sur de gros projets et programmes.

6

1.2) L'interface de MS Project

❑ Versions :

MS Project (MSP) se présente sous plusieurs versions :

- **Microsoft Project standard** : gestion de projets.
- **Microsoft Project Server** : gestion de portefeuille de projets (GPP) et engagement de ressources.


❑ N. B:

MS Project ne tourne que sous [Microsoft Windows](#) !

Si vous utilisez un Mac ou Linux, il vous faudra installer Windows sur une [machine virtuelle](#), ou opter pour une alternative compatible.

7

1.2) L'interface de MS Project – Vue d'ensemble

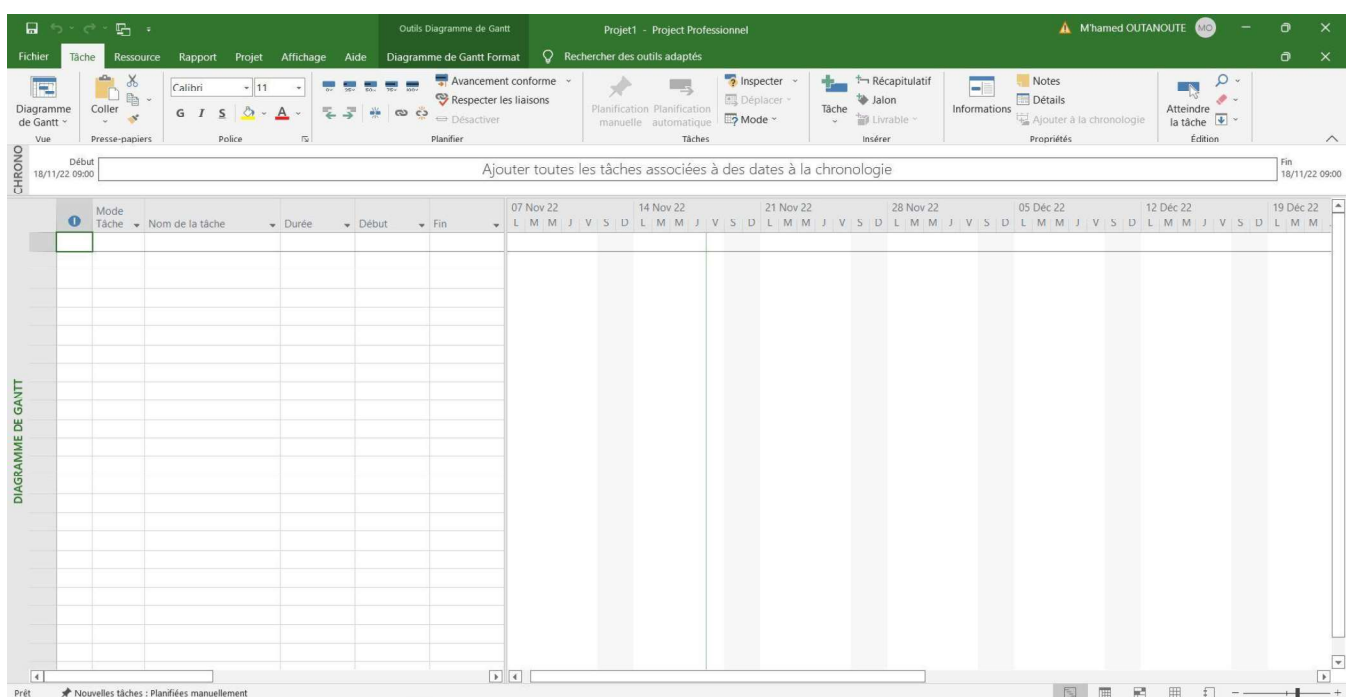

8

1.2) L'interface de MS Project – Menus


Project propose 6 **menus** (onglets) principaux :

- ❖ **Fichier**, menu particulier (qui modifie l'allure de l'interface pour une vue plus épurée) permettant de travailler sur les options globales du système et de gérer les projets (ouverture, enregistrement, exports...)
- ❖ **Tâche**, qui présente toutes les fonctionnalités importantes liées au traitement des tâches : liens, hausser/abaisser, jalons...
- ❖ **Ressource**, qui permet de gérer les ressources (humaines et matérielles) du projet
- ❖ **Rapport**, qui propose un puissant moteur de reporting pour présenter les données et communiquer sur un projet
- ❖ **Projet**, qui présente des raccourcis intéressants pour gérer les propriétés générales du projet (modifier la date de départ, modifier les heures de travail, champs personnalisés...)
- ❖ **Format**, qui permet de modifier l'apparence des éléments, mais aussi de mettre en avant certains points importants dans un projet (tâches critiques/en retard, chemin de tâche, etc.)

9

1.2) L'interface de MS Project – Chronologie

- ❑ Apparue avec la version 2010 du logiciel, la chronologie est une vue très pratique permettant de communiquer une vision simplifiée et « haut niveau » d'un projet, sous la forme de « frise chronologique ».
- ❑ Il est même possible, depuis la version 2016, de créer plusieurs versions de la chronologie d'un projet, avec des niveaux de détail différents (utile pour communiquer avec différents profils dans l'entreprise par exemple, ou faire un « zoom » sur une phase du projet).

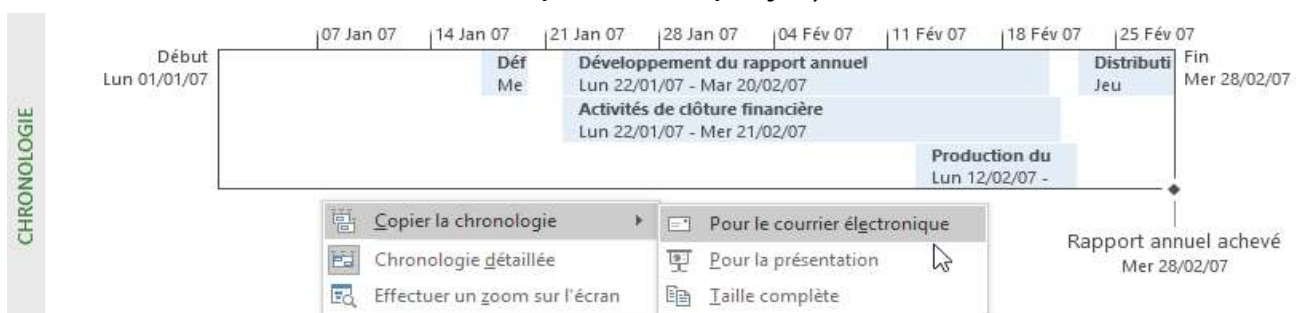

1.3) Création d'un projet – Modes de création

- ❑ MS Project permet de créer des projets de plusieurs manières :
 - En partant d'une feuille vierge
 - En s'appuyant sur un modèle prédéfini
 - En important des données depuis une sources externe (comme Excel, SharePoint, ...)
- ❑ Dans cette formation, nous allons travailler **en créant un projet vierge**. Le lecteur trouvera sur le net moult exemples d'utilisation de modèles et/ou procédures d'import en cas de besoin.
- ❑ En sauvegardant votre projet, vous obtenez un fichier à l'extension **.mpp**, le format de fichier propriétaire de MS Project.

11

1.3) Création d'un projet – Paramétrer le projet

❑ Définition de la date de début du projet :

- Dans l'onglet **Projet**, cliquez sur l'icône **Informations sur le projet**.
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous pouvez alors saisir une date de début pour votre projet, dans le champ **Date de début**.



❑ Paramétrage du calendrier :

- Dans l'onglet **Projet**, cliquez sur l'icône **Modifier les horaires de travail**.
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, vérifiez que les jours et horaires de travail du calendrier Standard sont bien conforme à votre organisation.
Si ce n'est pas le cas, modifiez-les.



12

1.3) Création d'un projet – Paramétrer le projet

☐ Vérification des unités :

- Dans l'onglet **Fichier**, cliquez sur le bouton **Options**.
- Une fenêtre **Options de Project** s'ouvre alors.
 - Le lien **Affichage** permet de paramétrer la devise,
 - Le lien **Échéancier** permet de régler le mode d'affichage des durées (jours par défaut) et du travail (heures par défaut).

Une fois ces paramètres réglés, cliquez sur le bouton OK.

☐ Tâche récapitulative du projet :

- Une tâche générique fictive qui englobera toutes les autres tâches, et permettra d'afficher la durée totale estimée du projet.
- Faites en sorte qu'elle apparaisse bien pour votre projet en cochant la case **Afficher la tâche récapitulative du projet** via le menu **Fichier > Options > Options avancées**.

13

2) Planification

2.1) Planification dynamique

2.2) Saisie des tâches

2.3) Modes de planification des tâches

2.4) Les différents types des tâches

2.5) Les éléments à saisir

2.6) Hiérarchisation des tâches

2.7) Lien « prédécesseur » entre tâches

2.8) Personnalisation des types de liaisons

14

2.1) Planification dynamique

- ❑ Revient à créer les tâches du projet sans leur assigner de dates fixes (statiques), en les reliant entre-elles pour traduire les contraintes structurelles du projet.
- ❑ Ainsi, c'est le logiciel qui, de manière dynamique, calculera les différentes dates et durées, en fonction d'autres paramètres du projet, que l'on pourra faire varier à souhait pour, par exemple, faire des **simulations** :
 - Que se passe-t-il si j'ai plusieurs personnes supplémentaires pour travailler sur mon projet ?
 - Est-ce que je peux ainsi améliorer mes délais de livraison (avancer la date de fin de projet) ?

15

2.2) Saisie des tâches

- ❑ Assurez-vous d'être en mode « **Diagramme de Gantt** » :
 - Dans l'onglet **Tache**, la case **Vue** du ruban MS Project (tout à gauche) doit être paramétrée sur **Diagramme de Gantt**.
 - Si ce n'est pas le cas, faites le en cliquant sur le bouton !
- ❑ Une fois sur la vue diagramme de Gantt, vous allez saisir l'ensemble de vos tâches « au kilomètre », sans vous soucier de les hiérarchiser. Sur chaque ligne, une tâche.



16

2.3) Modes de planification d'une tâche

- ❑ Deux modes sont disponibles quand vous créez une tâche :
 - **Le mode automatique**
 - **Le mode manuel**
- ❑ En **mode automatique**, toutes les données de la tâche (durée, date de début, date de fin...) sont liées entre-elles et recalculées automatiquement par le moteur de planification de Project lors de tout changement.

Il est toutefois nécessaire que toutes ces informations aient une valeur renseignée, ce qui implique que le logiciel les complètera automatiquement avec des valeurs par défaut lors de l'initialisation.

	Une tâche auto	1 jour	Lun 09/01/17	Lun 09/01/17
---	----------------	--------	--------------	--------------

17

2.3) Modes de planification d'une tâche

- ❑ En **mode manuel**, les données ne sont pas liées par le moteur de planification... ce qui n'est généralement pas ce que vous souhaitez faire.

En revanche, ce nouveau mode présente l'intérêt de pouvoir créer des tâches avec certaines données « non renseignées », ce qui peut être utile en début de projet quand on n'a encore que peu d'informations sur ces dernières.

	Une tâche manuelle			
---	--------------------	--	--	--

- ❑ Pour modifier le mode de planification (par défaut : mode manuel), cliquer sur le bouton **Nouvelles tâches : Planifiées manuellement** en bas à gauche de l'écran, et modifiez ceci en **Nouvelles tâches : Planifiées automatiquement**.

18

2.4) Les différents types de tâches

- ❑ Il existe 3 types importants de tâches :
 - La **tâche normale** : elle est représentée par une **barre** sur le diagramme de Gantt.
 - La **tâche récapitulative** : une sorte de tâche fictive regroupant d'autres tâches. Elle est représentée par un **trait** sur le diagramme de Gantt.
 - Le **jalón** : une tâche qui n'a pas de durée, mais qui représente juste un événement dans le projet (comme une décision par exemple). Il est représenté par un **losange** sur le diagramme de Gantt.

19

2.5) Les éléments à saisir

- ❑ Pour chaque tâche, vous allez saisir :

- Le **nom de la tâche**
- Sa **durée estimée**

C'est MS Project qui s'occupera de compléter les dates de début et de fin, de façon dynamique.


- ❑ **N. B.** :

Sauf besoin spécifique, ne précisez jamais manuellement de dates de début et de fin : si vous le faites, les possibilités de simulations et de calculs dynamiques de MS Project s'en verront grandement diminuées.

20

2.6) Hiérarchisation des tâches

- ❑ Le projet est découpé en tâches, puis sous-tâches, etc..., établissant de fait une hiérarchie.
- ❑ Sous MS Project, cette hiérarchie va se matérialiser par le fait de **Hausser/Abaiss**er les tâches, de manière à définir des **sous-tâches** ou des **tâches récapitulatives**.

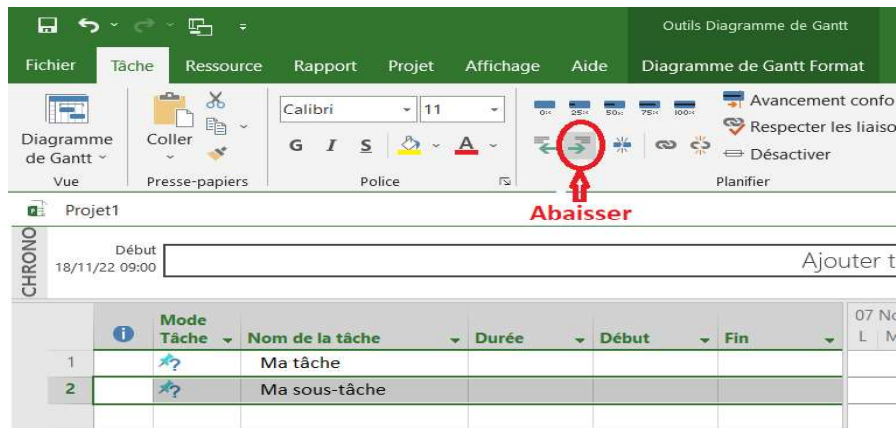

21

2.7) Lien « prédécesseur » entre tâches

- ❑ Au cours de l'analyse Pert, nous avons établi des liens de type prédécesseur entre nos différentes tâches : certaines tâches doivent systématiquement être réalisées avant d'autres.

Nous allons à présent représenter ces liens dans MS Project.

- ❑ Il existe plusieurs façons de lier des tâches entre-elles sous Project ; nous allons en voir deux :
 - Le bouton « **Lier les tâches sélectionnées** »
 - Le champ « **Prédécesseur** »

22

2.7) Lien « prédécesseur » entre tâches

❑ Imaginons que nous souhaitons repeindre une chambre.

Un WBS (**Work Breakdown Structure**) inclurait deux étapes importantes : la préparation et la peinture.

Voici une proposition de WBS :

❖ Repeindre la chambre

▪ Préparation

- Décaper
- Étaler la sous-couche

▪ Peinture

- Étaler la première couche
- Étaler la deuxième couche

23

2.7) Lien « prédécesseur » entre tâches

❑ Créons à présent nos tâches sous Project, et hiérarchisons-les.


- Ne nous occupons pas pour le moment des durées, et laissons les valeurs par défaut.
- Ne précisons pas non plus de dates fixes, et assurons-nous d'être en mode « tâches planifiées automatiquement ».

Mode Tâche ▼	Nom de la tâche ▼	Durée ▼	Début ▼	Fin ▼
	▸ Préparation	1 jour?	18/11/22 09:00	18/11/22 18:00
	Décaper	1 jour?	18/11/22 09:00	18/11/22 18:00
	Étaler la sous-couche	1 jour?	18/11/22 09:00	18/11/22 18:00
	▸ Peinture	1 jour?	18/11/22 09:00	18/11/22 18:00
	Étaler la première couche	1 jour?	18/11/22 09:00	18/11/22 18:00
	Étaler la deuxième couche	1 jour?	18/11/22 09:00	18/11/22 18:00

24

2.7.1) Le bouton « lier les tâches sélectionnées »

- ❑ On ne doit pas étaler la sous-couche avant d'avoir décapé le support : nous allons spécifier ce lien grâce au bouton **Lier les tâches sélectionnées** :

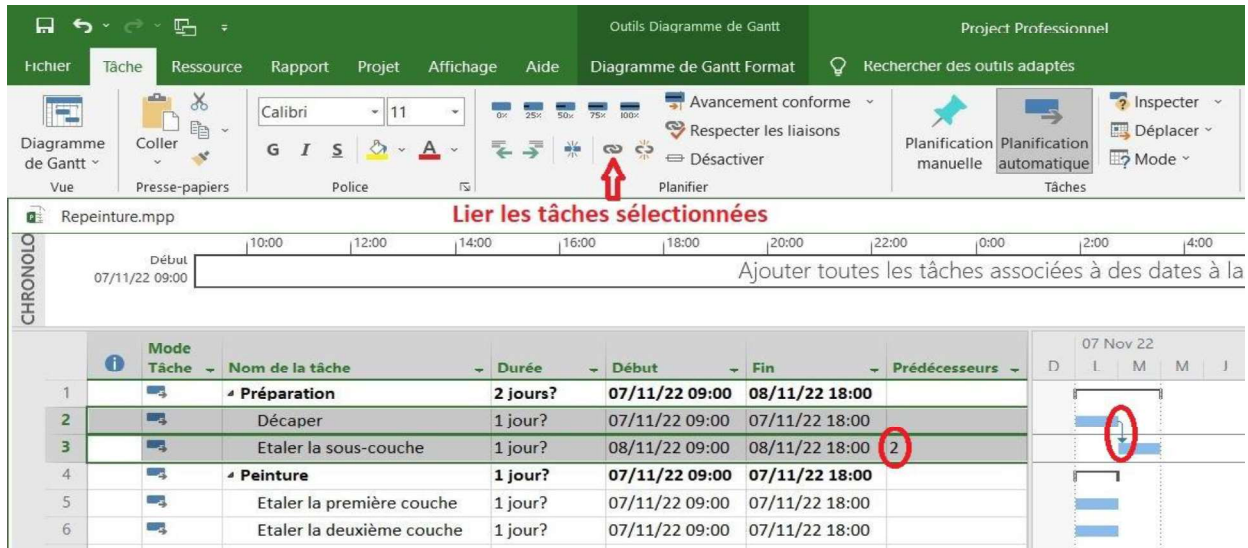

Repeinture.mpp

Lier les tâches sélectionnées

Ajouter toutes les tâches associées à des dates à la

	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs
1		Préparation	2 jours?	07/11/22 09:00	08/11/22 18:00	
2		Décapage	1 jour?	07/11/22 09:00	07/11/22 18:00	
3		Étaler la sous-couche	1 jour?	08/11/22 09:00	08/11/22 18:00	2
4		Peinture	1 jour?	07/11/22 09:00	07/11/22 18:00	
5		Étaler la première couche	1 jour?	07/11/22 09:00	07/11/22 18:00	
6		Étaler la deuxième couche	1 jour?	07/11/22 09:00	07/11/22 18:00	

2.7.2) Lien via le champ « Prédécesseur »

- ❑ Une autre manière de faire est de saisir directement le ou les prédécesseur(s) dans le champ de la colonne « Prédécesseur » du tableau Gantt.
- ❑ Pour illustrer le fonctionnement avec plusieurs tâches liées, créons une nouvelle tâche « Acheter de la peinture » : il faudra nécessairement aller « acheter de la peinture » **et** « avoir terminé la préparation » pour commencer à peindre.
- ❑ De même, il faudra nécessairement terminer d'étaler la première couche avant de commencer la deuxième couche.

2.7.2) Lien via le champ « Prédécesseur »

❑ Notre nouveau WBS est le suivant :

❖ Repeindre la chambre

■ Achats

- Acheter de la peinture

■ Préparation

- Décaper
- Étaler la sous-couche


■ Peinture

- Étaler la première couche
- Étaler la deuxième couche

27

2.7.2) Lien via le champ « Prédécesseur »

❑ Créons à présent nos liens :

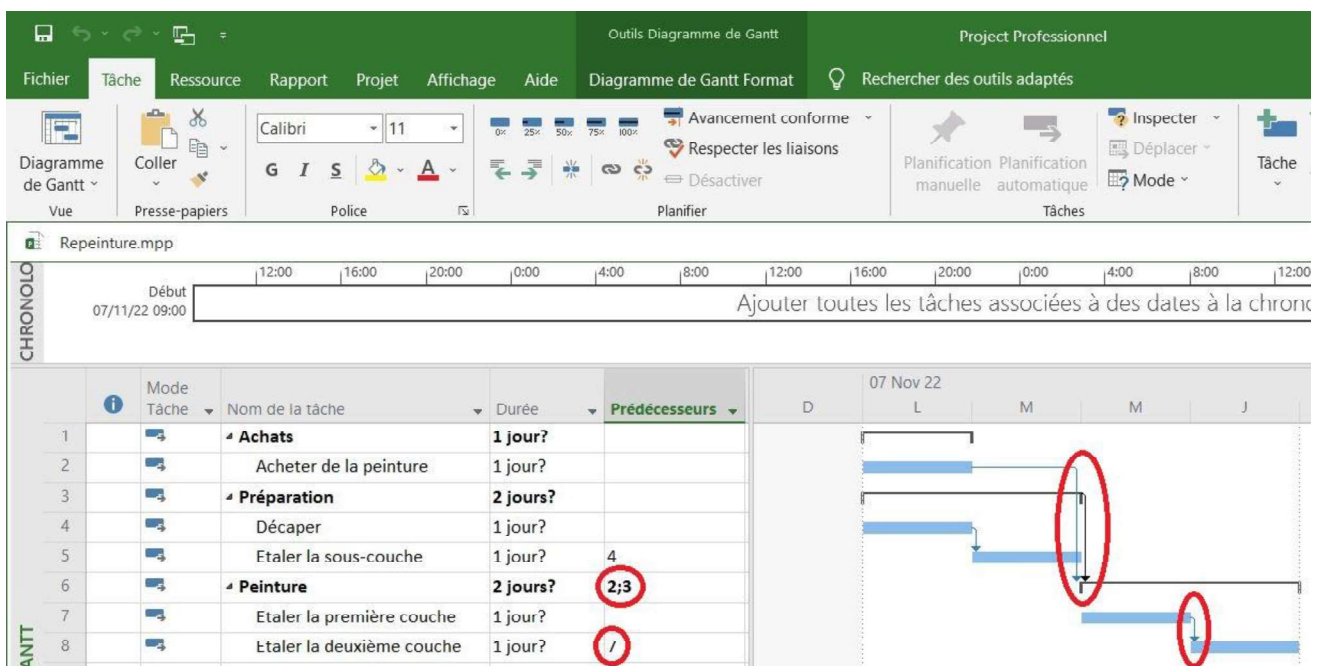

2.7.2) Lien via le champ « Prédécesseur »

- ❑ Nous remarquons qu'il est possible de référencer aussi bien des tâches « normales » que des tâches récapitulatives dans le champ « Prédécesseur ».
- ❑ Remarquez qu'il est spécifié que l'on ira acheter de la peinture en même temps que l'on préparera le support (Décaper): ce n'est pas absurde ! Difficile tout seul en effet, mais si vous ajoutez une ressource au projet avec pour responsabilité d'aller faire les courses (Acheter de la peinture), c'est tout à fait jouable.
- ❑ Cette **parallélisation de certaines tâches** représentera souvent une manière de gagner du temps.

29

2.8) Personnalisation des types de liaisons

- ❑ Admettons que nous avons un problème : si l'on commence à étaler la peinture alors que la sous-couche n'est pas encore sèche, le résultat ne sera pas folichon 😞.
- ❑ Nous devons donc disposer d'un moyen d'affiner les liens entre tâches, notamment pour :
 - Préciser les types de liaisons;
 - Spécifier un décalage (plus tard ou plus tôt) entre la réalisation de deux tâches liées.
- ❑ MS Project propose 4 types de liaison : **fin à début, début à début, fin à fin, début à fin**.

30

2.8.1) La liaison « fin à début » (FD)

- ❑ C'est la liaison par défaut dans MS Project.
- ❑ Si une tâche t_2 a pour valeur de prédécesseur **t1FD** (ou, par défaut, **t1**), alors **t_2 ne pourra s'exécuter que quand t_1 sera terminée** (pas forcément tout de suite après d'ailleurs, qu'importe...).



Figure - On ne peut pas faire passer le test avant d'avoir terminé la formation (lien **fin à début**)

31

2.8.2) La liaison « début à début » (DD)

- ❑ Si t_2 a pour prédécesseur **t1DD**, alors **t_2 ne peut pas commencer avant le début de t_1** .




Figure – On ne peut pas faire émerger avant que la formation ait démarré (lien **début à début**)

32

2.8.3) La liaison « fin à fin » (FF)

- ❑ Si t_2 a pour prédécesseur t_1 FF, alors t_2 doit se terminer en même temps que t_1 .




Figure – Le formateur ne peut pas arrêter de surveiller la salle avant la fin du contrôle (lien **fin à fin**)

33

2.8.4) La liaison « début à fin » (DF)

- ❑ Si t_2 a pour prédécesseur t_1 DF, alors t_2 ne peut pas se terminer tant que t_1 n'a pas commencé, mais t_2 peut se terminer à n'importe quel moment après le début de t_1 .



Figure – lien **fin à fin**

34

2.8.5) Décalages

❑ Comme vu plus haut, nous avons également besoin de pouvoir reporter la réalisation d'une tâche un peu plus tard (ou plus tôt) avant la fin ou le début d'une autre tâche : autrement dire, introduire un décalage de réalisation.

❑ Prenons un exemple concret : nous ne devons pas peindre avant que la sous-couche ait eu le temps de sécher.

Disons que la sous-couche sèche en 6 heures : MS Project va nous aider à préciser que la tâche récapitulative « Peinture » doit commencer au minimum 6 heures après que la tâche « Étaler la sous-couche » se soit terminée.

❑ Encore une fois, nous pouvons utiliser plusieurs techniques.

35

2.8.5) Décalages

❑ Soit, utiliser le champ « Décalage » dans le fenêtre « Informations sur la tâche », onglet « Prédécesseurs » :

Informations sur la tâche récapitulative

Général | Prédécesseurs | Ressources | Avancées | Remarques | Champs personnalisés

Nom : Peinture Durée : 1,71 jour ☐ Estimée

Prédécesseurs :

N°	Nom de la tâche	Type	Décalage
2	Acheter de la peinture	Fin à début (FD)	0j
3	Préparation	Fin à début (FD)	6h

Aide OK Annuler

36

2.8.5) Décalages

- ❑ Soit, plus exotique, taper directement le code de précédence incluant le décalage dans le champ « Prédécesseurs » du tableau Gantt :

		Mode Tâche ▾	Nom de la tâche ▾	Prédécesseurs ▾
1			▴ Achats	
2			Aller acheter de la peinture	
3			▴ Préparation	
4			Décaper	
5			Étaler la sous-couche	4
6			▴ Peinture	2;3FD+6 heures
7			Étaler la première couche	
8			Étaler la deuxième couche	7

37

3) Estimation des tâches

- ❑ Au cours de l'analyse Pert, nous avons estimé la durée de chaque tâche : nous allons à présent retranscrire cette mesure dans MS Project.
- ❑ Toutes les tâches possèdent une date de début et une date de fin.
- ❑ Ces dates ne sont potentiellement pas connues lors de la planification, et cela n'est pas grave ! Bien au contraire, dans le cadre d'une planification dynamique, nous allons généralement nous concentrer sur d'autres éléments permettant simplement de déduire ces dates : la **durée**, le **travail** (charge) et la **capacité**.

38

3) Estimation des tâches

3.1) Estimation par la durée

3.2) Estimation par le travail ou par l'effort

3.3) À propos des marges de sécurité

39

3.1) Estimation par la durée

- ☐ Par défaut, MS Project n'affiche dans la vue Gantt qu'une colonne d'**estimation par la durée** (la colonne d'estimation par le travail est masquée).
- ☐ Nous allons commencer par ce mode d'estimation.
- ☐ Il s'agit ici de spécifier, de manière absolue, **combien de temps durera la réalisation d'une tâche** : qu'importe le nombre de personnes qui y travailleront.
- ☐ Pour chaque tâche dans la vue « Diagramme de Gantt » de Project, saisissez une durée dans la colonne **Durée**.

40

3.1) Estimation par la durée

	i	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Prédécesseurs
1			▸ Achats	0,29 jour	
2			Acheter de la peinture	2 heures	
3			▸ Préparation	1,43 jours?	
4			Décaper	1 jour?	
5			Etaler la sous-couche	3 heures	4
6			▸ Peinture	1,71 jours	2;3FD+6 heures
7			Etaler la première couche	3 heures	
8			Etaler la deuxième couche	3 heures	7FD+6 heures

N.B. : Remarquez que vous ne pouvez pas saisir de durée pour les tâches récapitulatives : normal, cette durée est automatiquement calculée comme étant la somme des sous-tâches les composant.

41

3.1) Estimation par la durée

□ Unités :

La saisie est intuitive, et MS Project « comprendra » différentes unités. Voici quelques exemples :

Valeur saisie	Valeur enregistrée par MS Project
30min	30 minutes
7h	7 heures
6j	6 jours
2m	2 mois

42

3.2) Estimation par le travail ou par l'effort

- ❑ Une autre manière de faire, plus pertinente quand on souhaite exploiter le plein potentiel de planification dynamique de MS Project, est de ne pas spécifier des durées mais une **quantité de travail** (autrement dit une **charge**) pour estimer nos tâches.
- ❑ C'est notamment très intéressant quand plusieurs personnes sont censées intervenir sur la même tâche, avec des taux d'occupation variables.
- ❑ Comme mentionné plus haut, Project ne fait pas apparaître par défaut la colonne **Travail** par défaut dans la vue **Diagramme de Gantt**.

43

3.2) Estimation par le travail ou par l'effort

- ❑ Commencez donc par l'ajouter en cliquant sur l'entête **Ajouter une nouvelle colonne** (à la droite du tableau Gantt), puis en sélectionnant **Travail**.

		Mode Tâche ▼	Nom de la tâche ▼	Durée ▼	Prédécesseurs ▼	travail
1			▸ Achats	0,29 jour	Travail	^
2			Acheter de la peinture	2 heures	Travail budgétaire	
3			▸ Préparation	1,43 jours?	Travail budgétaire de référence	
4			Décaper	1 jour?	Travail budgétaire de référence1	
5			Etaler la sous-couche	3 heures	Travail budgétaire de référence10	
6			▸ Peinture	1,71 jours	Travail budgétaire de référence2	
7			Etaler la première couche	3 heures	Travail budgétaire de référence3	
8			Etaler la deuxième couche	3 heures	Travail budgétaire de référence4	
					Travail budgétaire de référence5	
					Travail budgétaire de référence6	
					Travail budgétaire de référence7	
					Travail budgétaire de référence8	

44

3.2) Estimation par le travail ou par l'effort

- ❑ Imaginons que la tâche préparatoire de décapage des murs de la pièce nécessite 7 heures de boulot, et qu'elle puisse être réalisée par plusieurs personnes à la fois (en supposant qu'elles aient les outils nécessaires et se supportent dans la même pièce).

Mode Tâche ▼	Nom de la tâche ▼	Travail ▼	Durée ▼
	▷ Achats	0 heure	0,29 jour
	◀ Préparation	10 heures	1,43 jours?
	Décaper	7 heures	1 jour?

45

3.2) Estimation par le travail ou par l'effort

- ❑ Si deux personnes travaillant chacune 7 heures par jour se mettent à décaper ensemble, elles pourront alors venir à bout de cette tâche en une demi-journée !
- ❑ Quand on travaille sur la charge (estimation du travail), la durée est calculée automatiquement et est mise à jour en fonction de l'affectation de ressources sur la tâche.

Ce comportement comporte quelques subtilités (durée/travail/capacité fixe, pilotage par l'effort) sur lesquelles nous reviendront dans la partie « [Affectation des ressources](#) ».

46

3.3) À propos des marges de sécurité

- ❑ Estimer des tâches est un élément central de la vie du chef de projet, et... ce n'est pas évident.
- ❑ Généralement, ce dernier s'appuiera sur les estimation des personnes qui vont réaliser le travail, ou leurs représentants.
- ❑ Le problème est que quand on demande à quelqu'un « Combien de temps mettrais-tu pour faire ceci ? », la personne concernée a généralement tendance à fournir une valeur qui ne reflète pas la réalité, soit parce qu'elle :
 - Ne sait pas le faire,
 - Veut se protéger en y appliquant un coefficient de sécurité (buffer),
 - Sait qu'elle va se faire challenger par la suite,
 - Veut se ménager du temps pour faire autre chose...

47

3.3) À propos des marges de sécurité

❑ Rationaliser la durée des tâches :

Il est important, lors de la phase d'estimation, de faire le maximum pour obtenir **des estimations réelles du travail nécessaire pour réaliser la tâche**, et non pas une estimation grossière incluant une « sécurité ».

Les marges (qui sont bien entendue nécessaires si on ne veut pas exploser le planning à tous les coups...) seront appliquées plus tard, de manière **globale** au projet.

48
