

Gestion de Projet

Pr. M'hamed OUTANOUE

mhamed.outanoute@gmail.com

Année universitaire : 2025/2026

1

Chapitre 5 : MS PROJECT – Partie 2

- 1. Gestion des ressources**
- 2. Gestion des couts**
- 3. Suivi du projet**

2

1) Gestion des ressources

1.1) Les ressources sous MS Project

1.2) Création des ressources

1.3) Affectation des ressources

1.4) Importance de type tâche

1.5) Multi-tâche

1.6) Tâche pilotée par l'effort

3

1.1) Les ressources sous MS Project

□ MS Project permet de gérer 3 types de ressources :

■ Les ressources « **travail** » :

- Il s'agit d'une ressource permettant de réaliser un travail, et que l'on peut affecter à la réalisation d'une tâche.
- Ce peut être une ressource humaine (designer, développeur, grutier...) ou autre (une pelleteuse, un service sur le cloud...).

■ Les ressources « **coût** » : un poste de dépense fixe, comme par exemple l'achat de matériel, des frais de déplacement...

■ Les **consommables** : une ressource dont on peut indiquer un coût à l'unité, et dont on utilisera, pour une tâche donnée, une certaine quantité (eau, câble...)

4

1.1) Les ressources sous MS Project

- ❑ Une propriété intéressante des ressources est qu'elles peuvent être **génériques** ou **nominatives**.
 - Si l'on sait par exemple que l'on aura besoin d'un graphiste, on marquera cette ressource « travail » comme **générique** (peu importe qui sera ce graphiste).
 - Si l'on sait que le graphiste en question est *Pierre Durand*, ce sera une ressource **nominative**.
- ❑ Les noms des types de ressources (notamment « *ressource travail* ») peuvent être déroutants au premier abord... tâchez de vous familiariser avec eux en pratiquant !

5

1.2) Création des ressources

- ❑ Nous allons à présent créer les ressources qui seront par la suite utilisées au sein du projet.

Imaginons que nous ayons à disposition les ressources suivantes :

Nom de la ressource	Disponibilité sur le projet	Taux horaire
Raoul Aplintan	Plein temps (7 heures/jour)	30€/heure
Yvonne Amitan	Mi-temps	40€/heure

6

1.2) Création des ressources

- ❑ Pour ce faire, ouvrez le tableau des ressources en cliquant sur le petit quadrillage en bas à droite de l'écran.

Un nouveau tableau s'ouvre : sur chaque ligne de ce tableau, saisissez une ressource et choisissez son type (travail, coût, consommable).

		Nom de la ressource ▼	Type ▼	Étiquette Matériau ▼	Initiales ▼	Groupe ▼	Unités max ▼	Tx. standard ▼	T
1		Raoul Aplintan	Travail		R		100%	30,00 €/heure	
2		Yvonne Amitan	Travail		Y		50%	40,00 €/heure	

7

1.3) Affectation des ressources

- ❑ Une fois les ressources créées dans le tableau des ressources, elles sont disponibles pour affectation aux différentes tâches.
- ❑ Pour expliquer les différentes méthodes d'affectation des ressources, nous allons nous mettre au vert et travailler localement sur une tâche très simple : tondre la pelouse.
- ❑ Admettons que nous ayons un terrain de 10000 m² à tondre, et qu'une personne équipée d'une tondeuse soit capable de tondre 400 m² en 1 heure. Il y a donc environ 25 heures pour tondre le terrain.



8

1.3) Affectation des ressources

❑ Par défaut : ressources infinies

Mode Tâche ▼	Nom de la tâche ▼	Travail ▼	Durée ▼	Début ▼	Fin ▼
	Tondre la pelouse	25 heures	1 jour	Jeu 02/01/20	Jeu 02/01/20

Figure – Par défaut, les ressources sont infinies :
25 heures de travail en 1 jour !

9

1.3) Affectation des ressources

❑ Affectation d'une ressource en travail fixe :

Il est temps d'affecter des ressources à cette tâche :
mettons Raoul sur le coup !

Mode Tâche ▼	Nom de la tâche ▼	Travail ▼	Durée ▼	Début ▼	Fin ▼	Noms ressources ▼
	Tondre la pelouse	25 heures	3,57 jours	Jeu 02/01/20	Mar 07/01/20	Raoul Aplintan

En spécifiant à MS Project que Raoul va travailler sur la tâche, le moteur de planification met automatiquement à jour la **durée** de la tâche et sa **date de fin** (remarquez le fond bleu pâle).

Notre tâche prendra donc 3,57 jours à raison de 7 heures de travail quotidien du dévoué Raoul, et se terminera donc le 7 janvier.

10

1.3) Affectation des ressources

❑ Affectation d'une ressource supplémentaire :

Pour accélérer les choses, et puisque nous disposons d'une ressource supplémentaire, nous allons l'affecter aussi à notre tâche :

Mode	Tâche ▼	Nom de la tâche ▼	Travail ▼	Durée ▼	Début ▼	Fin ▼	Noms ressources ▼
		Tondre la pelouse	25 heures	2,38 jours	Jeu 02/01/20	Lun 06/01/20	Raoul Aplintan;Yvonne Amitan[50%]

Souvenons-nous qu'Yvonne travaille à mi-temps : MS Project le précise (« [50%] »).

Notre tâche passe de 3,57 jours à 2,38 jours, pour une quantité de travail toujours égale à 25 heures.

11

1.4) L'importance du type de tâche

- ❑ Remarquez que pour le moment, la valeur dans la colonne « Travail » (la charge) est restée fixe, et que Project a recalculé les autres valeurs par rapport à elle (durée, date de fin...) : ceci est dû au fait que notre tâche est de type « Travail fixe ».

Informations sur la tâche

Général | Prédécesseurs | Ressources | Avancées | Remarques | Champs personnalisés

Nom : Tondre la pelouse Durée : 2,38 jou ☐ Estimée

Contrainte sur la tâche

Échéance : NC

Type de contrainte : Dès Que Possible Date de la contrainte : NC

Type de tâche : Travail fixe ☒ Pilotée par l'effort

Calendrier : Aucun ☐ Les prévisions ignorent les calendriers des ressources

Code WBS : 1

Méthode de valeur acquise : % achevé

☐ Marquer la tâche en tant que jalon

Aide OK Annuler

12

1.4) L'importance du type de tâche

❑ Passage en type « Durée fixe » :

Gardons nos affectations de ressources, mais double-cliquons sur la ligne de la tâche et passons la tâche en type « Durée fixe ».

Assignons à notre tâche une durée fixée de 2 jours (via la colonne «Durée»).

Moc	Tâcl	Nom de la tâche	Travail	Durée	Début	Fin	Noms ressources
		Tondre la pelouse	25 heures	2 jours	Jeu 02/01/20	Ven 03/01/20	Raoul Aplintan;Yvonne Amitan[50%]
		Des ressources assignées à cette tâche sont surutilisées. Pour afficher des options, veuillez cliquer avec le bouton droit.					

Et oui, nous avons un problème !

(remarquez le petit bonhomme rouge qui est apparu à gauche de la ligne) !

13

1.4) L'importance du type de tâche

❑ Passage en type « Durée fixe » :

En effet, il nous faut fournir un effort de travail de 25 heures en 2 jours, avec une ressource qui travaille 7 heures par jour (Raoul) et une autre qui travaille à mi-temps (donc 3,5 heures par jour : Yvonne).

$$\text{Notre capacité} = (7 + 3,5) \times 2 = 21 \text{ heures}$$

Nous avons une capacité de travail de 21 heures sur deux jours de travail.

Impossible donc d'abattre une charge de 25 heures : on dit que **la ressource est surutilisée**.

Il faut travailler plus ou se donner un objectif moins ambitieux !

14

1.4) L'importance du type de tâche

❑ Passage en type « Durée fixe » :

Laissons donc Project adapter la durée de la tâche pour qu'elle soit réalisable (clic droit sur la ligne de la tâche) :




Figure – Il nous faut plus de temps :
Project propose d'augmenter la durée de la tâche...

15

1.5) Multi-tâche

❑ Nous allons essayer d'affecter plusieurs tâches à la fois à nos ressources.

❑ Ajoutons donc une tâche « Aller acheter de l'essence » : 1 heure devrait suffire. Disons-donc que Raoul va s'en charger.


Mc	Tâche	Nom de la tâche	Travail	Durée	Début	Fin	Noms ressources
		Tondre la pelouse	25 heures	3,57 jours	Jeu 02/01/20	Mar 07/01/20	Raoul Aplintan;Yvonne Amitan[50%]
		Aller acheter de l'essence	1 heure	1 jour?	Jeu 02/01/20	Jeu 02/01/20	Raoul Aplintan[14%]

Figure – Affectation de notre nouvelle tâche à Raoul :
problème, il est déjà bien occupé...

16

1.5) Multi-tâche

- ❑ Puisque le planning avait été calculé avec une affectation totale du temps de Raoul sur la tonte, le fait de lui ajouter, dans le même temps, une nouvelle tâche qui va lui prendre du temps, crée un nouveau problème de surutilisation de ressource.
- ❑ Nous allons demander à MS Project de replanifier cette tâche dès que Raul aura un peu de temps à y consacrer... c'est à dire quand il aura fini son travail sur la tâche de tonte.



Mc	Tâc	Nom de la tâche	Travail	Durée	Début
		Tondre la pelouse	25 heures	3,57 jours	Jeu 02/01/20
		Aller acheter de l'essence	1 heure	1 jour?	Jeu 02/01/20

OK, notre tâche est à présent replanifiée un peu plus tard.

17

1.5) Multi-tâche

- ❑ Remarquez néanmoins qu'aller chercher de l'essence quand on a presque fini de tondre n'est pas forcément la meilleure idée qu'il soit : dans notre cas précis, il serait plus avantageux de revoir les contraintes structurelles du projet, en spécifiant que la tâche « Aller acheter de l'essence » doit intervenir avant la tonte...
- ❑ Cette solution réglerait, elle aussi, la problématique de surutilisation :



Mc	Tâc	Nom de la tâche	Travail	Durée	Début	Fin	Noms ressources	Prédécesseurs
		Tondre la pelouse	25 heures	3,57 jours	Mar 07/01/20	Ven 10/01/20	Raoul Aplintan;Yvonne An 2	
		Aller acheter de l'essence	1 heure	1 jour?	Lun 06/01/20	Lun 06/01/20	Raoul Aplintan[14%]	

18

1.6) Tâche pilotée par l'effort

- ❑ Le pilotage par l'effort est une notion importante de MS Project.
- ❑ Une tâche pilotée par l'effort est planifiée de telle manière que l'effort (quantité de travail à accomplir) pour la compléter reste constant en cas d'ajout ou suppression d'affectation de ressources.
- ❑ Autrement dit, pour une tâche pilotée par l'effort, si j'ajoute une ressource, je réduis la durée de la tâche. Si j'enlève des ressources, j'allonge la durée de la tâche.

REMARQUE : Bien entendu, si une tâche est de type « Travail fixe », elle est forcément pilotée par l'effort !

19

1.6) Tâche pilotée par l'effort

- ❑ Pour illustrer ce fonctionnement, ajoutons une tâche « Aller déposer l'herbe à la déchetterie », qui sera réalisée une fois la tonte terminée. Nous spécifions que cette tâche n'est pas pilotée par l'effort, et qu'elle devrait a priori demander 2 heures de travail. Raoul se chargera de faire ce boulot.

Mc Tâche	Nom de la tâche	Travail	Durée	Début	Fin	Noms ressources	Pilotée par l'effort
	Tondre la pelouse	25 heures	25 heures?	Jeu 02/01/20	Mar 07/01/20	Raoul Aplintan;Yvonne Amitan[!]	Oui
	Aller acheter de l'essence	1 heure	1 heure?	Jeu 02/01/20	Jeu 02/01/20	Raoul Aplintan	Oui
	Aller déposer l'herbe à la déchetterie	2 heures	2 heures?	Mar 07/01/20	Mar 07/01/20	Raoul Aplintan	Non

Informations sur la tâche

Général | Prédecesseurs | Ressources | Avancées | Remarques | Champs personnalisés

Nom : Aller déposer l'herbe à la déchetterie Durée : 2 heures ☒ Estimée

Contrainte sur la tâche

Échéance : NC

Type de contrainte : Dès Que Possible Date de la contrainte : NC

Type de tâche : Capacité fixe ☐ Pilotée par l'effort

20

1.6) Tâche pilotée par l'effort

- ❑ À présent, affectons une ressource supplémentaire à cette tâche.

Aller déposer l'herbe à la déchetterie	3 heures	2 heures?	Mar 07/01/20	Mar 07/01/20	Raoul Aplintan; Yvonne Amitan[50%]	Non
--	----------	-----------	--------------	--------------	---------------------------------------	-----

Comme la tâche n'est pas dirigée par l'effort, MS Project se dit :
« OK, nous avons plus de ressources, elles vont pouvoir réaliser plus de travail sur la même durée ».

21

1.6) Tâche pilotée par l'effort

- ❑ Plutôt que ce comportement, on pourrait s'attendre à ce que Project réagisse en ajustant laissant le travail fixe et en ajustant la durée : nous allons pour cela passer la tâche en pilotage par l'effort.

Mc Tâche	Nom de la tâche	Travail	Durée	Début	Fin	Noms ressources	Pilotée par l'effort
	Tondre la pelouse	25 heures	25 heures?	Jeu 02/01/20	Mar 07/01/20	Raoul Aplintan;Yvonne A	Oui
	Aller acheter de l'essence	1 heure	1 heure?	Jeu 02/01/20	Jeu 02/01/20	Raoul Aplintan	Oui
	Aller déposer l'herbe à la déchetterie	2 heures	1,33 heure:	Mar 07/01/20	Mar 07/01/20	Raoul Aplintan; Yvonne Amitan[50%]	Oui

Cette fois, notre tâche nécessitant 2 heure de travail a pour durée 1 heure et 20 minutes quand on ajoute une ressource pouvant y travailler à mi-temps !

22

2) Gestion des coûts

2.1) Coût d'un projet

2.2) Saisie des coûts

A) Saisie des coûts liés aux ressources

B) Saisie des coûts fixes

C) Saisie des consommables

D) Estimation globale

2.3) Allocation des coûts au cours de l'avancement du projet

23

2.1) Coût d'un projet

- ❑ Le coût d'un projet doit être vu comme la somme des coûts induits par le traitement de toutes les tâches du projet.

Ceci inclut notamment :

- Le coût du travail des ressources;
 - Les coûts fixes;
 - Les coûts liés aux consommables utilisés pendant le projet.
- ❑ À un instant t du projet, certains coûts ont déjà été engagés, et d'autres sont prévus. On parle alors de :
 - *Coûts réels* (l'argent qui a déjà été dépensé);
 - *Coûts restants* (l'argent qui va être dépensé plus tard).

24

2.2.A) Saisie des coûts liés aux ressources

- ❑ Chaque ressource du projet a un coût.
Par exemple, une personne qui travaille a un taux horaire.
- ❑ Imaginons que nous ayons pour projet de «préparer un gâteau».
- ❑ Commençons par créer la tâche, qui doit demander environ 4 heures de travail, dans le tableau des tâches :

Mode Tâche ▼	Nom de la tâche ▼	Travail ▼	Durée ▼	Début ▼	Fin ▼
	Préparer un gâteau	4 heures	4 heures?	Lun 02/01/17	Lun 02/01/17

25

2.2.A) Saisie des coûts liés aux ressources

- ❑ Nous allons à présent créer une **ressource de type travail**, le **cuisinier**, et lui affecter un taux horaire (ainsi qu'un taux horaire pour les heures supplémentaires), via le tableau des ressources :

Nom de la ressource ▼	Type ▼	Étiquette Matériau ▼	Initiales ▼	Groupe ▼	Capacité max. ▼	Tx. standard ▼	Tx. hrs. sup. ▼
Cuisinier	Travail		C		100%	10,00 €/heure	15,00 €/heure

- ❑ Nous pouvons maintenant affecter cette ressource à notre tâche :

Mode Tâche ▼	Nom de la tâche ▼	Travail ▼	Durée ▼	Début ▼	Fin ▼	Noms ressources ▼
	Préparer un gâteau	4 heures	4 heures?	Lun 02/01/17	Lun 02/01/17	Cuisinier

26

2.2.B) Saisie des coûts fixes

- ❑ Pour travailler, notre cuisinier a besoin d'un four !

Il va falloir investir en achetant cet équipement, ce qui représente un **coût fixe** pour le projet.

- ❑ Pour cela, nous allons créer une « **ressource de type coût** » :

Nom de la ressource ▼	Type ▼	Étiquette Matériau ▼	Initiales ▼	Groupe ▼	Capacité max. ▼	Tx. standard ▼	Tx. hrs. sup. ▼
Cuisinier	Travail		C		100%	10,00 €/heure	15,00 €/heure
Achat d'un four	Coût		A				

27

2.2.B) Saisie des coûts fixes

- ❑ Nous pouvons à présent affecter ce coût à notre tâche :

Mode Tâche ▼	Nom de la tâche ▼	Travail ▼	Durée ▼	Début ▼	Fin ▼	Noms ressources ▼
	Préparer un gâteau	4 heures	4 heures?	Lun 02/01/17	Lun 02/01/17	Cuisinier;Achat d'un four[500,00 €]

Informations sur la tâche

Général

Prédécesseurs

Ressources

Avancées

Remarques

Champs personnalisés

Nom : Préparer un gâteau

Durée : 4 heure: ☐ Estimée

Ressources :

Nom de la ressource	Propriétaire de l'affectati	Unités	Coût
Cuisinier		100%	40,00 €
Achat d'un four			500,00 €

Aide

OK

Annuler

28

2.2.C) Saisie des consommables

- ❑ Notre cuisinier va utiliser de la farine et du chocolat pour confectionner son gâteau :

Ce sont des **consommables**, dont on estime un coût à l'unité, et dont on consommera une certaine quantité (nombre d'unités).

- ❑ Admettons que la farine coûte 6€ au kilo, et que le chocolat pâtissier coûte 15€ au kilo, et créons ces « **ressources de type consommable** » dans le **tableau des ressources** :

Nom de la ressource	Type	Étiquette Matériau	Initiales	Groupe	Capacité max.	Tx. standard	Tx. hrs. sup.
Cuisinier	Travail		C		100%	10,00 €/heure	15,00 €/heure
Achat d'un four	Coût		A				
Farine	Consommable		F			6,00 €	
Chocolat	Consommable		C			15,00 €	

29

2.2.C) Saisie des consommables

- ❑ Nous pouvons à présent les affecter à notre tâche « **Préparer un gâteau** », sachant que notre gâteau nécessitera a priori :

200 grammes (0,2 kg) de chocolat et 100 grammes (0,1 kg) de farine.

Mode Tâche	Nom de la tâche	Travail	Durée	Début	Fin	Noms ressources
	Préparer un gâteau	4 heures	4 heures?	Lun 02/01/17	Lun 02/01/17	Cuisinier;Achat d'un four[500,00 €]

Informations sur la tâche

Général

Prédécesseurs

Ressources

Avancées

Remarques

Champs personnalisés

Nom : Préparer un gâteau

Durée : 4 heure: ☐ Estimée

Ressources :

Nom de la ressource	Propriétaire de l'affectati	Unités	Coût
Cuisinier		100%	40,00 €
Achat d'un four			500,00 €
Chocolat		0,2	
Farine		0,1	

Aide

OK

Annuler

30

2.2.D) Estimation globale


❑ Maintenant que nous avons créé toutes les ressources et affecté nos coûts, il serait intéressant d'avoir une estimation globale du coût de notre projet.

❑ Visualisons donc rapidement la « **Vue d'ensemble des coûts** », rapport disponible dans l'onglet :

Rapport > Tableaux de bord > Vue d'ensemble des coûts.

31

2.2.D) Estimation globale

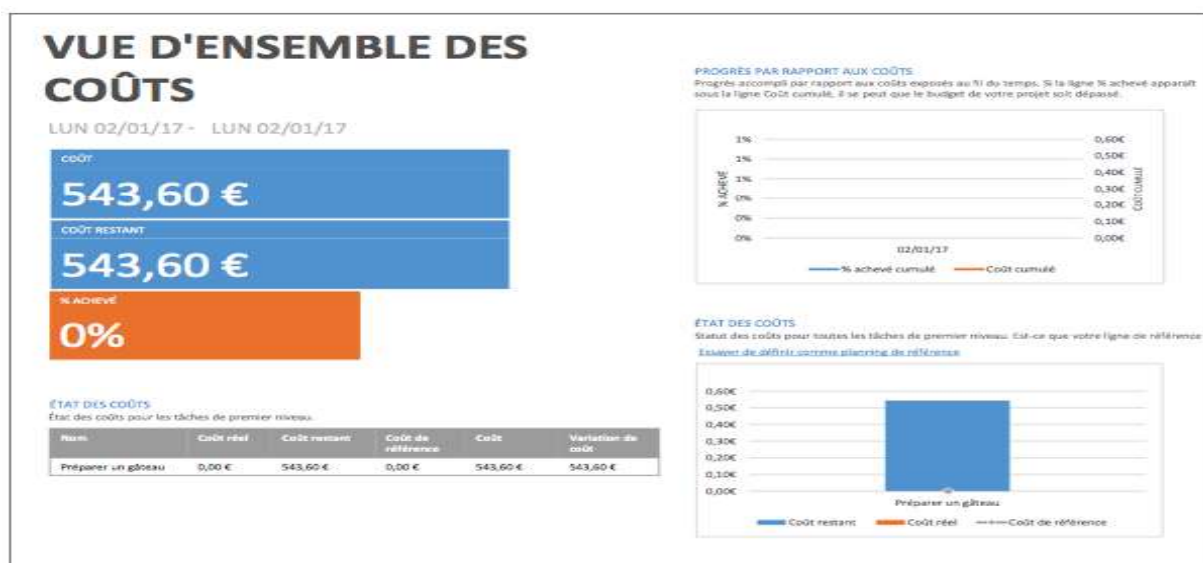

Notre projet nous coûtera donc a priori un peu plus de 540 euros, en tenant compte du salaire du cuisinier, de l'achat du four et du prix des consommables.

32

2.3) Allocation des coûts au cours de l'avancement du projet

- ❑ L'un des principaux intérêts des logiciels comme MS Project est de permettre un suivi fin des budgets.

Ainsi, il est intéressant de savoir que notre **projet devrait coûter x euros**, mais il l'est encore plus de savoir, au fil du projet, **ce qui a déjà été dépensé et ce qu'il reste à dépenser**.

- ❑ Pour ce faire, par défaut, MS Project va niveler les coûts sur la durée du projet, en les allouant *proportionnellement* à l'avancement.

Par exemple :

- Notre cuisinier payé 10€ de l'heure nous aura coûté 20€ au bout de 2 heures.
- À la moitié d'un projet de 4 jours, il nous aura coûté 140€ s'il travaille 7 heures par jour.

33

2.3) Allocation des coûts au cours de l'avancement du projet

- ❑ Logique... Sauf que l'on ne souhaite pas toujours niveler les choses de la sorte.

Par exemple, l'achat de notre four se fera probablement « *comptant* », au tout début du projet. L'argent sera dans ce cas dépensé en une fois.

- ❑ Pour ce faire, nous allons choisir entre une allocation des coûts :
 - Au début de la tâche;
 - Proportionnellement à l'avancement;
 - À la fin de la tâche.

34

2.3) Allocation des coûts au cours de l'avancement du projet

❑ Le coût de notre four sera alloué dès le début :

Nom de la ressource	Type	Étiquette Matériau	Initiales	Groupe	Capacité max.	Tx. standard	Tx. hrs. sup.	Coût/Ut
Cuisinier	Travail		C		100%	10,00 €/heure	15,00 €/heure	0,00 €
Achat d'un four	Coût		A					
Farine	Consommable		F			6,00 €		0,00 €
Chocolat	Consommable		C			15,00 €		0,00 €

Informations sur la ressource

Général Coûts Remarques Champs personnalisés

Nom de la ressource : Achat d'un four

Tables des taux de coûts

Pour les taux, tapez une valeur ou un pourcentage d'augmentation ou de diminution par rapport au taux précédent. Par exemple, si le coût par utilisation a diminué de 20 %, tapez -20%.

A (Par défaut) B C D E

Date d'effet	Taux standard	Taux heures sup.	Coût par utilisation
--------------	---------------	------------------	----------------------

Allocation des coûts : Proportion Début Proportion Fin

Aide Détails... OK Annuler

35

3) Suivi du projet

❑ Le suivi du projet comprend 3 étapes :

- 1) La création d'une planification initiale (planning de référence) basée sur les prévisions préliminaires ;
- 2) La mise à jour périodique des prévisions pour refléter l'avancement du projet ;
- 3) La comparaison des prévisions mises à jour avec le planning de référence en vue de déterminer si l'avancement est conforme à la planification.

36

3) Suivi du projet

3.1) Planning de référence

3.2) Date d'état

3.3) Mise à jour des réalisations

3.4) Visualisation des glissements

37


3.1) Planning de référence

- ❑ Pour assurer le suivi d'un projet, une fois celui-ci engagé, il est essentiel de pouvoir comparer le planning courant au planning établi à l'origine.
- ❑ Il est donc nécessaire d'enregistrer une copie du planning prévisionnel, on parle de **planning de référence**, avant de démarrer les travaux.
- ❑ Le planning de référence est celui auquel l'équipe de gestion de projet aboutit après accord sur l'ensemble des aspects (durée, coûts...) des différents acteurs concernés.

38

3.1) Planning de référence


- ❑ Pour enregistrer des prévisions en tant que planning de référence : **Projet > Définir le planning de référence**

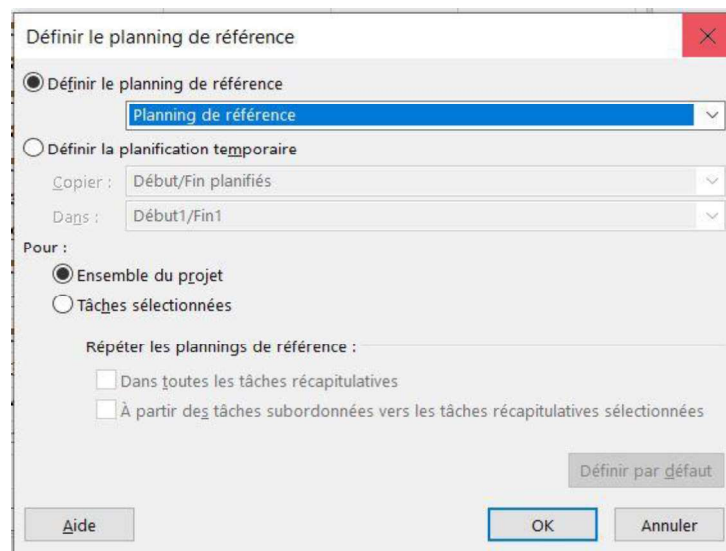

39

3.2) Date d'état

- ❑ C'est la date à laquelle le chef de projet dispose des informations les plus récentes pour signaler l'avancement du projet (pour effectuer la mise à jour du projet).
- ❑ Pour définir une date d'état :
Projet > Date d'état



- ❑ Si vous ne définissez pas la date d'état, la date actuelle est utilisée.

40

3.3) Mise à jour des réalisations

- ☐ Il s'agit d'indiquer l'avancement réel des tâches du projet.
- ☐ Ce qui nous permettra de connaître :
 - **Les tâches achevées**
 - **Les tâches en retard**
 - **Les tâches sans retard**
 - **Les tâches futures**

41

3.3) Mise à jour des réalisations

- ☐ Pour indiquer l'avancement d'une tâche sous forme de pourcentage, soit :
 - Pour chaque tâche : **Informations de la tâche > % achevé**
 - Ajouter une nouvelle colonne « **% achevé** » et renseigner un pourcentage d'accomplissement de chaque tâche.
- ☐ Si un certain nombre de tâches ont démarré et se sont achevées conformément aux prévisions, vous pouvez définir les dates de début et de fin réelles de toutes ces tâches en une seule opération :
 - Sélectionnez les tâches, choisissez l'onglet **Projet**, puis cliquez sur **Mettre à jour le projet**.
 - Sélectionnez l'option « **Tâches sélectionnées** », puis valider.

42

3.4) Visualisation des glissements

- ❑ La définition d'un planning de référence et la mise à jour régulière de vos prévisions vous permettent de comparer la première à l'avancement en cours afin d'identifier les variations:
 - des tâches qui n'ont pas commencé ou qui ne se sont pas terminées à temps ;
 - des tâches qui ne progressent pas au taux prévu ;
 - des tâches qui exigent plus ou moins de travail que prévu ;
 - des tâches qui dépassent le budget ou lui sont inférieures.
- ❑ L'utilisation d'un *planning de référence* vous permet également d'identifier les variations en comparant les coûts planifiés aux coûts prévus au fur et à mesure que le projet avance.
